


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

5月19日（月） ～ 6月1日（日）

【5/18更新】

<主な工事箇所>

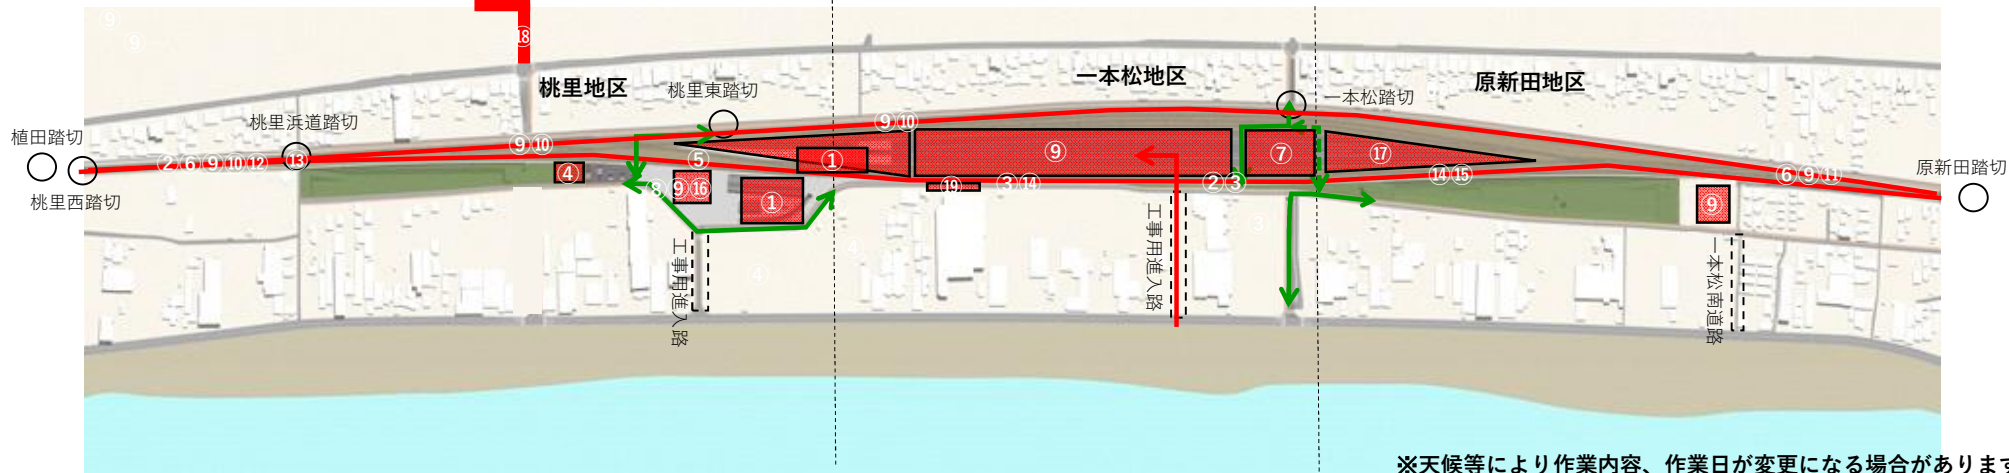

施工業者	施工 場所	主な工事の内容	5月														6月	備 考
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1		
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
2	名工建設(株)	①	擁壁工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		コンクリート打設：5/20（火）6時半～
3	名工建設(株)	②	排水工	－	－	－	－	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等
		③	路盤工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
		④	基礎工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
4	名工建設(株)	⑤	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日
		⑥	レール運搬工	●	●	－	－	－			－	－	－	－	－	－		夜間工事：5/19（月）
5	名工建設(株)	⑦	箱型構造物工・土工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	25t、50tクレーン、生コン車等
		⑧	配水管敷設工	●	●	－	－	－	－		－	－	－	－	●	－		道路規制（迂回路あり）：5/30（金）
12	新生テクノス(株)	⑨	電気工事（電柱建柱）	－	－	－	－	－	休工	●	●	●	●	●	●	●	休工	夜間工事：5/25（日）、5/26（月）、5/28（水）、5/30（金）、5/31（土）
		⑩	電気工事（架線調整）	－	－	－	－	－		－	－	●	●	－	－	夜間工事：5/28（水）		
		⑪	電気工事（基礎掘削）	－	－	－	－	●		－	●	－	●	－	－			
13	新生テクノス(株)	⑫	電気工事（点検梯子撤去工）	●	－	－	－	－	休工		－	－	－	－	－	休工		
14	新生テクノス(株)	⑬	電気工事（小型管路設置工）	－	－	－	－	－	休工		－	－	－	－	●	休工		
23	名工建設(株)	⑭	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		10tダンプトラック：3～5台/日
		⑮	分岐器設置工	－	－	－	－	－			●	●	●	●	●			10tユニック：1～2台/日（5/26）
26	名工建設(株)	⑯	基礎工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		生コン車：10～20台
		⑰	コンクリート打設工	－	●	－	－	●	－		－	●	－	－				
27	大藤建設（株）	⑱	河川改修工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		市道20148号線片側交互通行（R7.5月下旬～R7.6月中旬）
28	名工建設(株)	⑲	準備工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		市道20166号線車両通行止め（R7.6/2～R7.6月終旬）
