


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

8月25日（月）～ 9月7日（日）

【8/24更新】

<主な工事箇所>

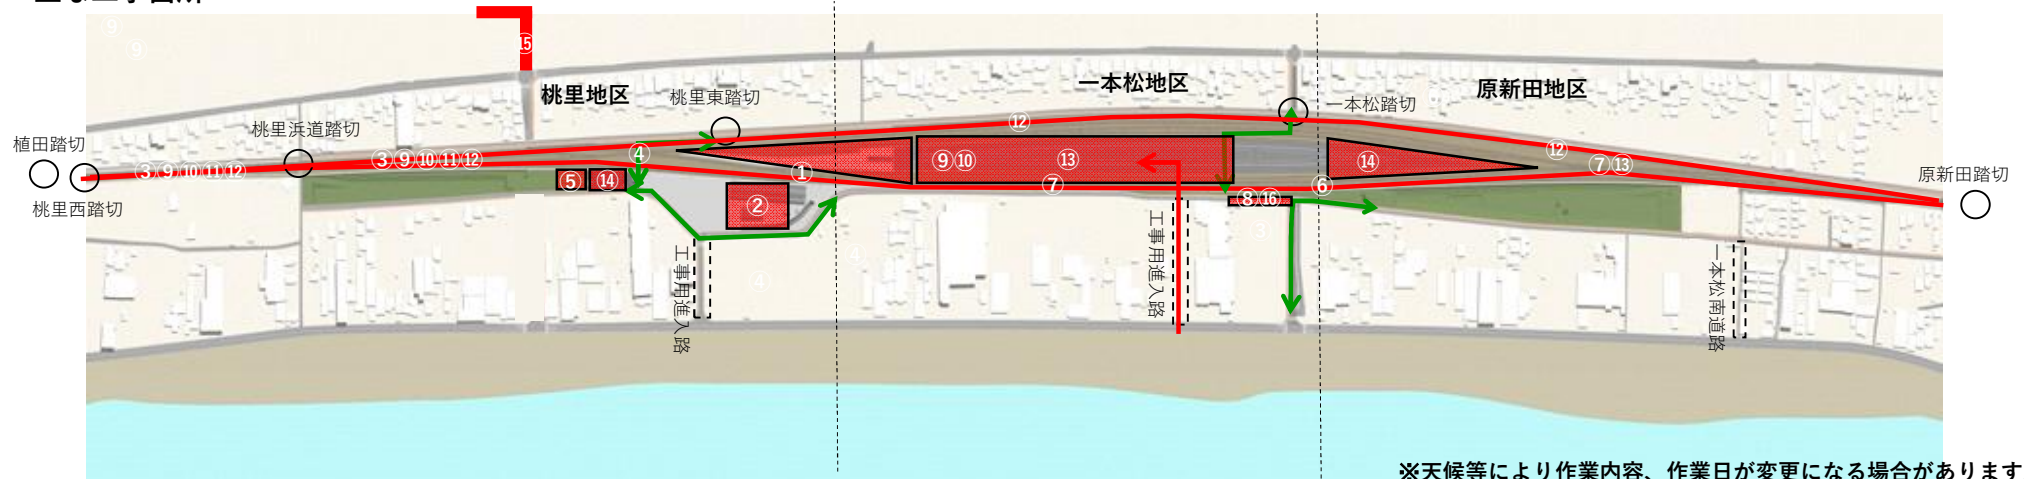

施工業者		施工 場所	主な工事の内容	8月							9月							備 考
				25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
1	東亜道路工業(株)	①	排水工・擁壁工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：1～2台/日
		②	土工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		場内運搬（一本松アンダー道路付近まで）
3	名工建設(株)	③	フェンス設置工	－	－	－	－	－	－	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品等納入 （中道・フロント部～桃里浜道踏切間）
		④	迂回路整備工	●	●	●	●	●	●		－	－	－	－	－	－		
		⑤	信号機室設置工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		大型車による製品等納入（中道・テクノサイエンス～名工現場事務所間）
		⑥	排水工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
4	名工建設(株)	⑦	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （名工建設現場事務所～作業ヤード）
5	名工建設(株)	⑧	場内整備工（崩土整備）	●	－	－	－	－	休工							8/25（月）：片側交互通行規制		
12	新生テクノス(株)	⑨	電気工事（電柱建柱工）	－	－	－	－	－	－	休工	－	－	●	●	－	－	休工	夜間工事：9/3（水）
		⑩	電気工事（基礎工・電車線設置工）	●	－	－	●	－	●		－	－	●	－	●	●		8/25（月）：10tダンプトラック：1台
13	新生テクノス(株)	⑪	電気工事（基礎工・管路工等）	－	●	－	－	－	●	休工	－	－	●	－	－	●	休工	4tユニック：10時～（電柱仮置き）
14	新生テクノス(株)	⑫	電気工事（ケーブル布設工等）	●	●	●	－	●	休工		－	－	－	●	●	●	休工	12tラフタークレーン
23	名工建設(株)	⑬	分岐器新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （名工建設現場事務所～作業ヤード）
26	名工建設(株)	⑭	建築工（内外装工）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	
27	大藤建設（株）	⑮	箱型構造物工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		市道02057号線（桃里公会堂前）車両通行止め（R7.7月14日～R7.10月下旬）
30	（株）一杉興業	⑯	準備工	－	－	－	－	●	休工							休工		市道20166号線（中道）車両通行止め
