


施工計画書

- 工事時間 月～土 8：30～17：00（進捗状況により変更有）
- 安全管理 施工期間中及び竣工後は、案内看板等を設置し交通安全に十分留意致します。工事車両出入口付近に交通整理員を配置し安全に留意するとともに清掃等を実施致します。
- 施工管理 着手に先立って調整池工事を先行して施工し雨水の流出、土砂の流出・崩壊が周辺地へ影響の及ぼすことの無いようにする。排水状況を確認し、排水能力が不足する場合は適宜排水路を追加して対応する。本排水路及び集水桝整備後に埋戻しをする。

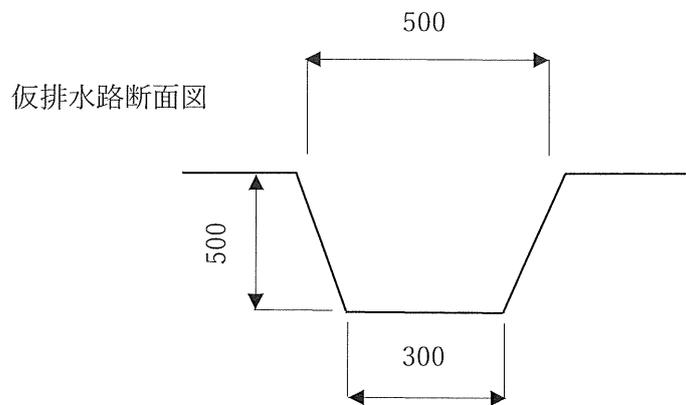

工 程 表

	R 8								R 9
	5	6	7	8	9	10	11	12	1
準備工	■								
伐採工	■	■							
土 工		■	■						
排水路工		■							
調整池工			■						
発電施設設置工				■	■	■			
電気設備工						■	■	■	
後片付け・検査									■
