


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

5月6日（月）～ 5月12日（日）

【4/21更新】

<主な工事箇所>

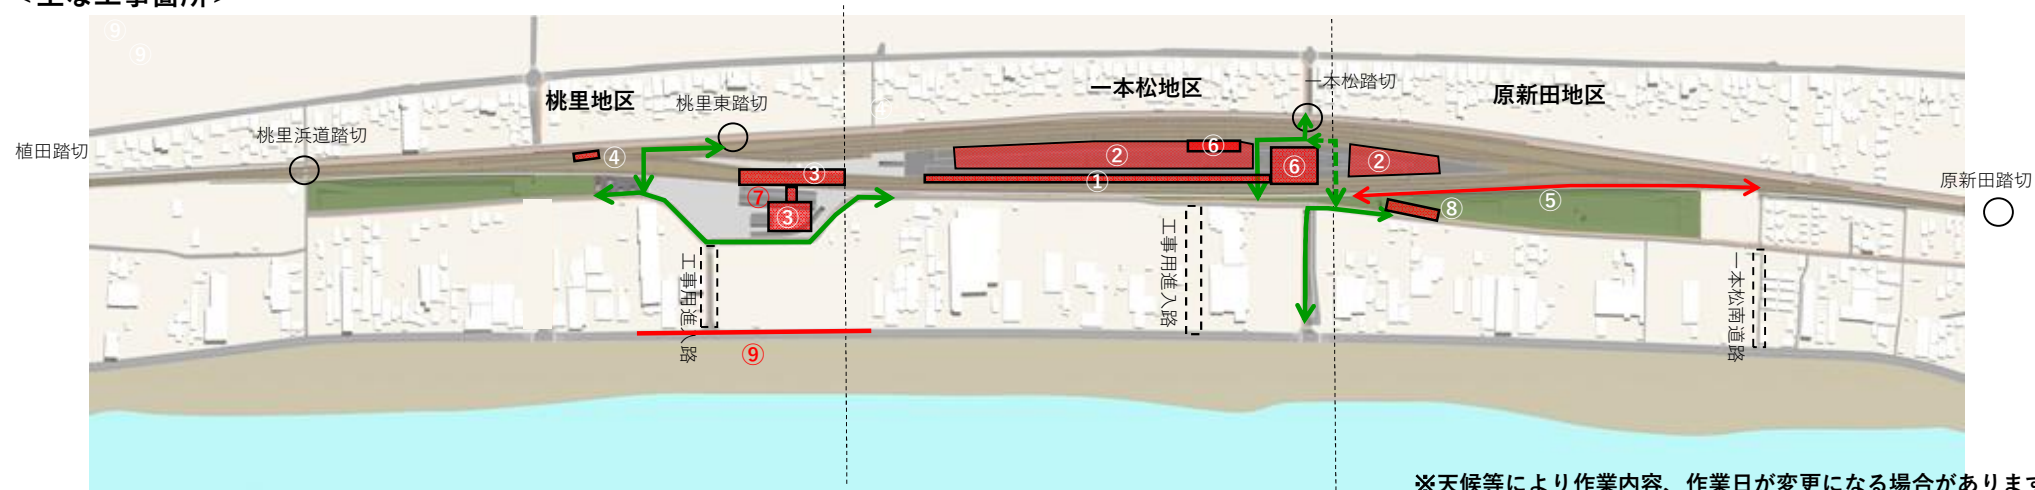

施工業者	施工場所	主な工事の内容	5月														備考					
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月	16月	17月	18月	19月						
1 東亜道路工業(株)	①	排水工（軌道部）	●	●	●	●	●	休工	休工	5月12日更新予定						製品搬入：大型1～3台/日						
	②	排水工（ホーム部）	●	●	●	●	●	休工	休工							砕石搬入：大型1～5台/日						
2 名工建設(株)	③	下部工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	●	休工													25tクレーン、生コン車、10tダンプ：1台（場内）、バックホウ：1台
3 名工建設(株)	④	グラウンドアンカー工	-	●	●	●	●	●	休工													
	⑤	排水溝設置	-	-	●	●	●	●	休工													
5 名工建設(株)	⑥	掘削工・グラウンドアンカー工	-	●	●	●	●	●	休工													10tダンプ×2台（場内）
7 大藤建設(株)	⑦	土工	●	●	●	●	●	休工	休工													
8 大岡建設工業(株)		準備工（測量・丁張等）	-	-	-	-	-	休工	休工													
11 (株)栄久建設	⑧	土工・ジオテキスタイル工	-	●	●	●	●	休工	休工													
15 (株)川村組		準備工	-	-	-	-	-	休工	休工													
17 富士峰建設(株)	⑨	準備工（測量等）	●	●	●	●	●	休工	休工													
