


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

12月1日（月） ～ 12月14日（日）

【11/30更新】

<主な工事箇所>

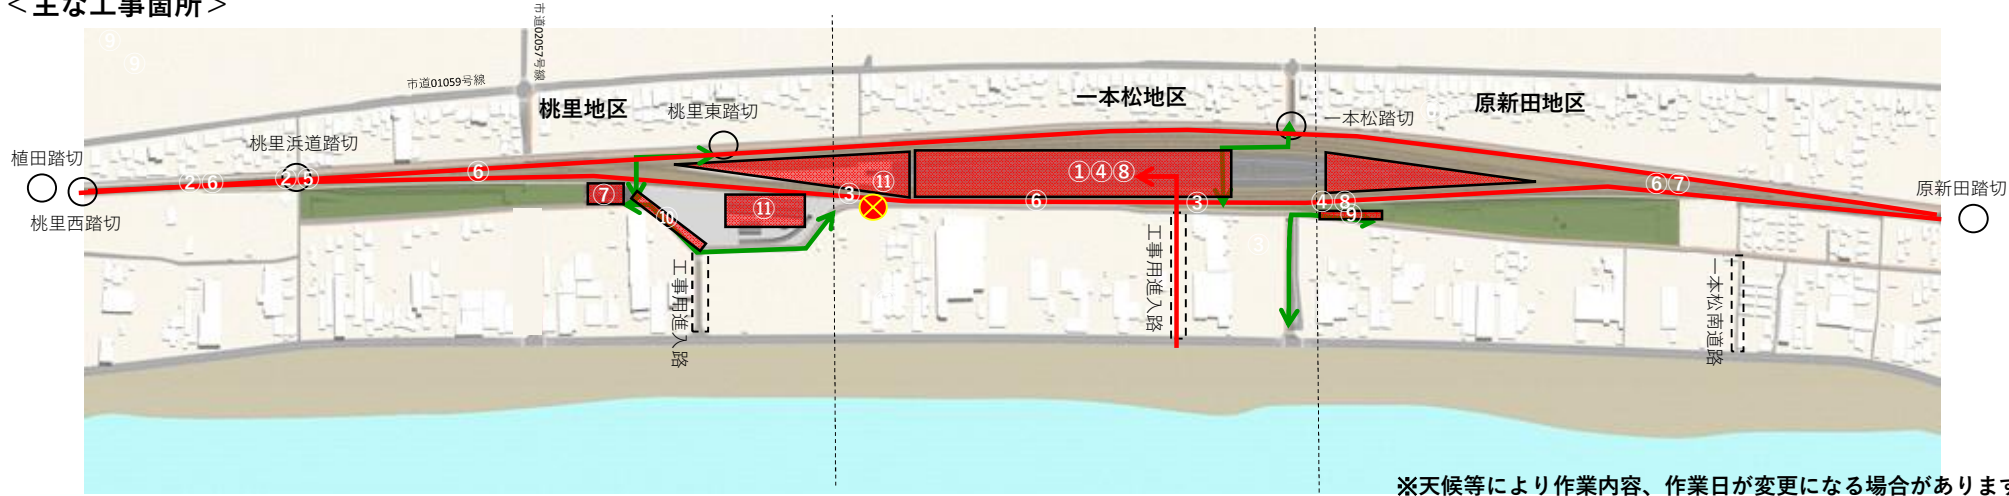

施工業者	施工場所	主な工事の内容	12月														備 考	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
1	東亜道路工業(株)	①	舗装工・路盤工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	●	休工	左記日程のうち、2～3日作業予定 大型車による製品等納入（桃里浜道踏切～中道・フロント部～テクノサイエンス間） ②桃里浜道踏切で車両通行止め：12/1（月）～12/5（金）
3	名工建設(株)	②	排水工撤去工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	
		③	路盤工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
4	名工建設(株)	④	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （名工建設現場事務所～作業ヤード） ※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有 令和8年5月中旬まで（24時間）
		⑤	踏切警備	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	新生テクノス(株)	⑥	電気工事（電柱、電車線設置等）	－	－	●↔●	●	●↔●	●	●	●↔●	●	●	－	休工		夜間工事：12/3（水）、12/5（金）、12/8（月） ⊗：中道車両通行止め（12/10（水））	
13	新生テクノス(株)	⑦	電気工事（避雷針設置工）	－	－	－	－	－	休工		●	－	●	●	●	休工		
23	名工建設(株)	⑧	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （フロント部～作業ヤード） ※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有
31	落合建設（株）	⑨	準備工（測量等）	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		
32	（株）大志建設	⑩	側溝設置工～舗装工（路盤工含む）	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		中道全面通行止め：12/11（木）～12/12（金）
33	名工建設（株）	⑪	地盤改良杭工	－	－	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		
