


新車両基地工事 2週間工程表

2月23日（月）～ 3月8日（日）

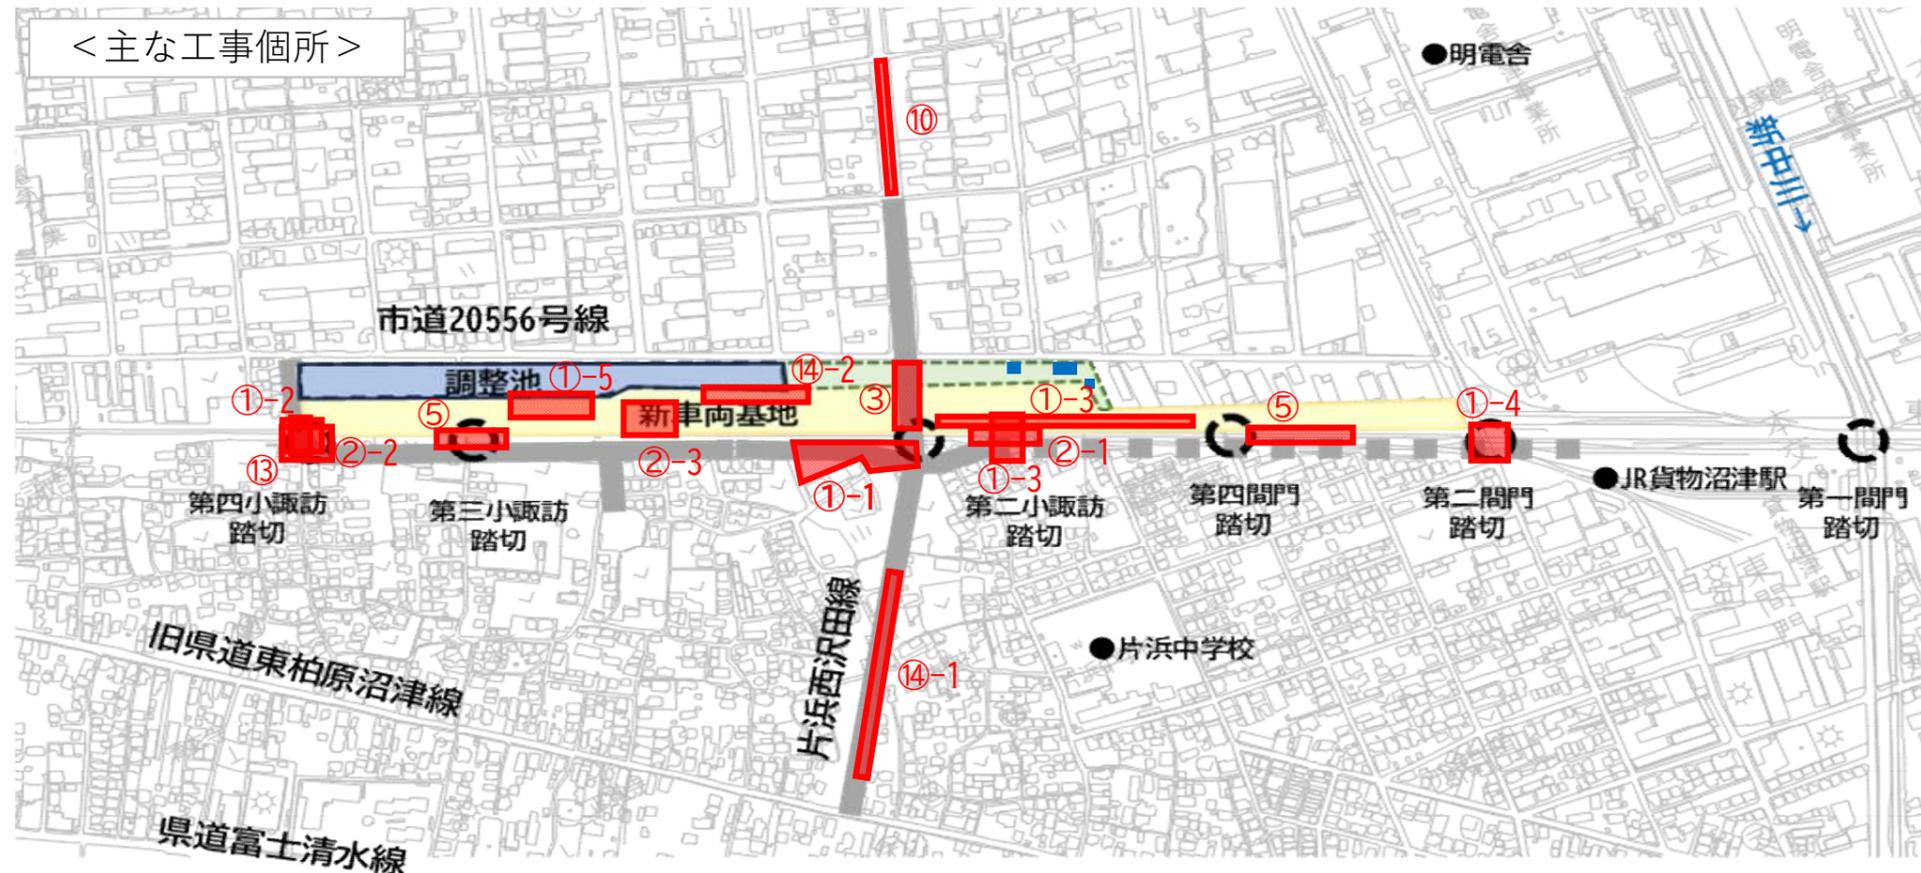

○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

■：現場事務所

施工業者	施工場所	主な工事の内容	2月						3月								備考
			23月	24火	25水	26木	27金	28土	1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道工事	○	◇	◇	◇	◇	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	○	休	◇騒音作業有り（削孔作業）
	①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
	①-3	仮線路盤・仮踏切設置工事	○	○	○	○	○●	休	●	○	○	○	○	○	○	休	●夜間作業有り（第二小諏訪踏切付近）※道路規制あり。別紙規制図参照
	①-4	横断管路工事	休	休	休	休	休	休	休	●	●	◆	◆	◆	◆	休	◆夜間騒音作業有り（第二間門踏切）●夜間作業有り（第三小諏訪踏切）※道路規制あり。
	①-5	土砂運搬	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	
双葉鉄道工業(株)	②-1	まくらぎ交換・道床つき固め	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
	②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	◆	休	休	◆	休	休	休	◇◆	◇◆夜間騒音作業有り（第四小諏訪踏切）
	②-3	レール取り卸し	休	休	休	休	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
名工建設(株)	③	地下道工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	○	○●	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	●夜間作業有り（第三小諏訪踏切付近）
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
名工建設(株)	⑬	道路整備工事	休	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
山旺建設工業(株)	⑭-1	舗装工事	休	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
	⑭-2	土砂運搬	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	休	休	休	休	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。
