


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

4月22日（月）～ 5月5日（日）

【4/21更新】

<主な工事箇所>

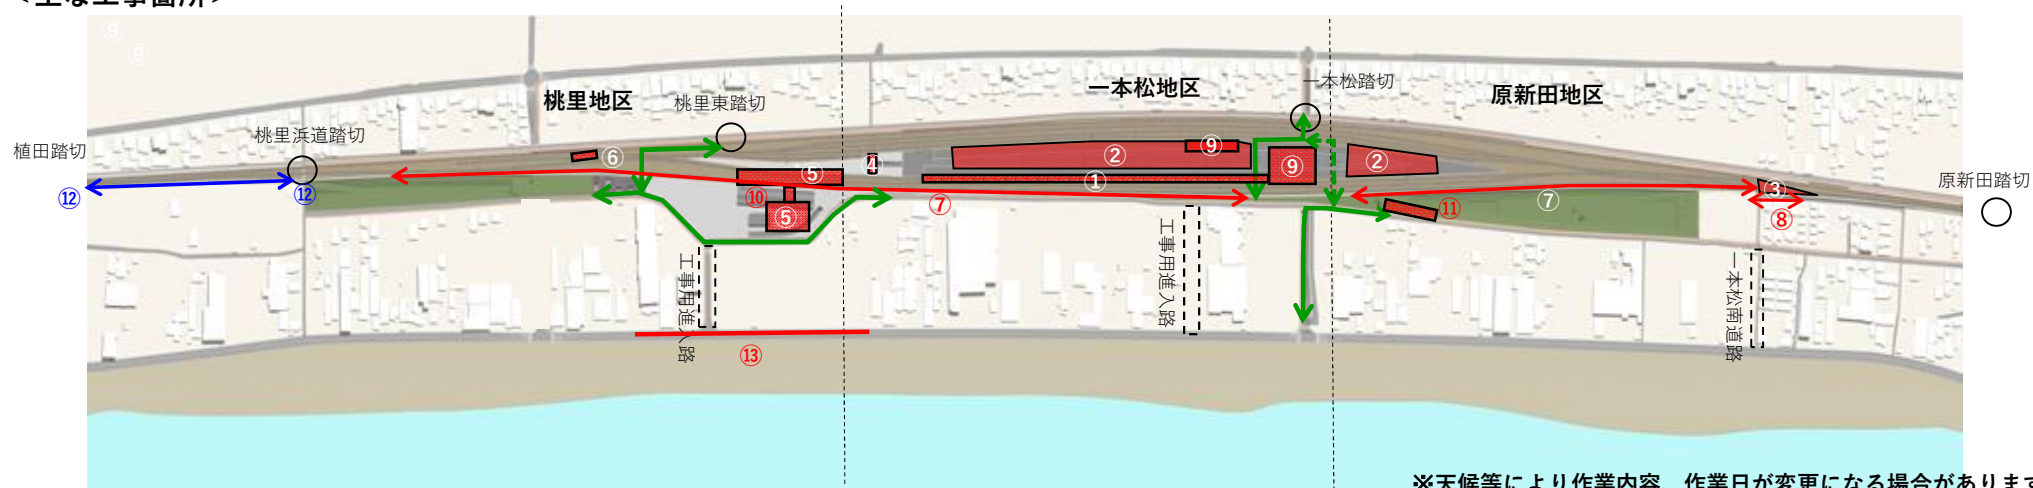

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

施工業者	施工場所	主な工事の内容	4月								5月					備考	
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4		5
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
1 東亜道路工業(株)	①	排水工（軌道部）	●	●	●	●	●	休工	休工	●	●	●	●	●	休工	休工	製品搬入：大型1～3台/日 砕石搬入：大型1～5台/日
	②	排水工（ホーム部）	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			
	③	電柱基礎工	●	●	-	-	-			-	-	-	-	-			
	④	擁壁工	-	-	-	-	-			●	●	●	●	●			
2 名工建設(株)	⑤	下部工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	-	休工	休工	25tクレーン、生コン車 10tダンプ：2台、バックホウ：2台
3 名工建設(株)	⑥	掘削工	●	●	●	-	-	休工	休工	-	-	-	-	-	休工	休工	
	⑦	排水溝設置	-	-	●	●	●			-	-	-	-	-			
	⑧	電柱基礎工	●	●	-	-	-			-	-	-	-	-			
5 名工建設(株)	⑨	掘削工・グラウンドアンカー工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	-	休工	休工	4/22～：10tダンプ×2台（場内）
7 大藤建設(株)	⑩	ボックスカルバート工	●	●	●	●	●	休工	休工	-	-	-	●	-	休工	休工	材料搬入：23日/6台、24日/6台
8 大岡建設工業(株)		準備工（測量・丁張等）	-	-	-	-	-	休工	休工	-	-	-	-	-	休工	休工	
11 (株)栄久建設	⑪	ブロック積工		●	●	●	●	休工	休工	●	●	●	-	-	休工	休工	
12 新生テクノス(株)	⑫	電車線路設備改良	-	-	-	●	●	休工	●	●	-	-	-	-	休工	休工	4/25・4/28夜間工事
17 富士峰建設(株)	⑬	準備工（測量等）	●	●	●	●	●	休工	休工	-	●	●	●	-	休工	休工	
