


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

5月5日 (月) ~ 5月18日 (日)

【4/20更新】

<主な工事箇所>

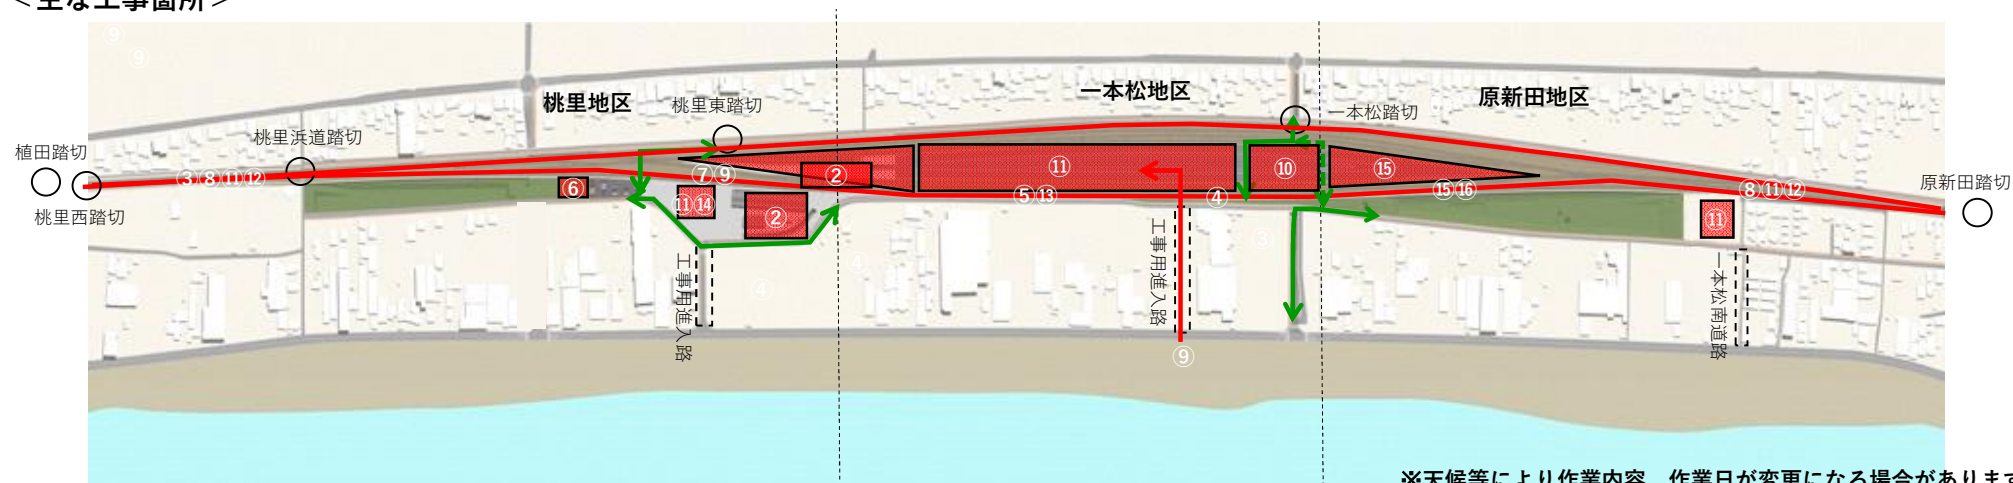

施工業者	施工場所	主な工事の内容	5月														備考
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
1 東亜道路工業(株)	①	排水工 (軌道部)	休工	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：1台/日			
2 名工建設(株)	②	擁壁工 (鉄筋、型枠、打設等)	休工	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	休工	25tクレーン、生コン車等			
3 名工建設(株)	③	排水溝撤去工	休工	●	●	●	●	休工	●	●	-	-	-	-	大型車による製品搬入等		
	④	排水溝設置工		-	-	-	-										
	⑤	路盤工		●	●	●	●										
	⑥	基礎工		●	●	●	●										
4 名工建設(株)	⑦	軌道新設工	休工	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	10tダンプトラック：3~5台/日 夜間工事：5/7 (水)、5/13 (火)、5/14 (水)、5/16 (金) トレーラー進入：5/8 (木) 5時~		
	⑧	マクラギ取替工		-	●	●	-		●	●	●	●	●	●			
	⑨	レール運搬工		-	-	●	●		-	-	-	-	-	-			
5 名工建設(株)	⑩	箱型構造物工・土工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	25t、50tクレーン、生コン車等		
12 新生テクノス(株)	⑪	電気工事 (電柱建柱・搬入)	休工	●	-	休工	●	●	-	-	-	休工	●	夜間工事：5/12 (月)、5/18 (日)			
	⑫	電気工事 (架線調整)		●	●	●	休工	-	-	-	●	●	休工				
23 名工建設(株)	⑬	軌道新設工	休工	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3~5台/日	
26 名工建設(株)	⑭	基礎工	休工	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	生コン車：6台		
	⑮	基礎工		-	-	-	-	休工	-	-	●	-	-	-			
