


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

12月29日（月）～1月11日（日）

【12/14更新】

<主な工事箇所>

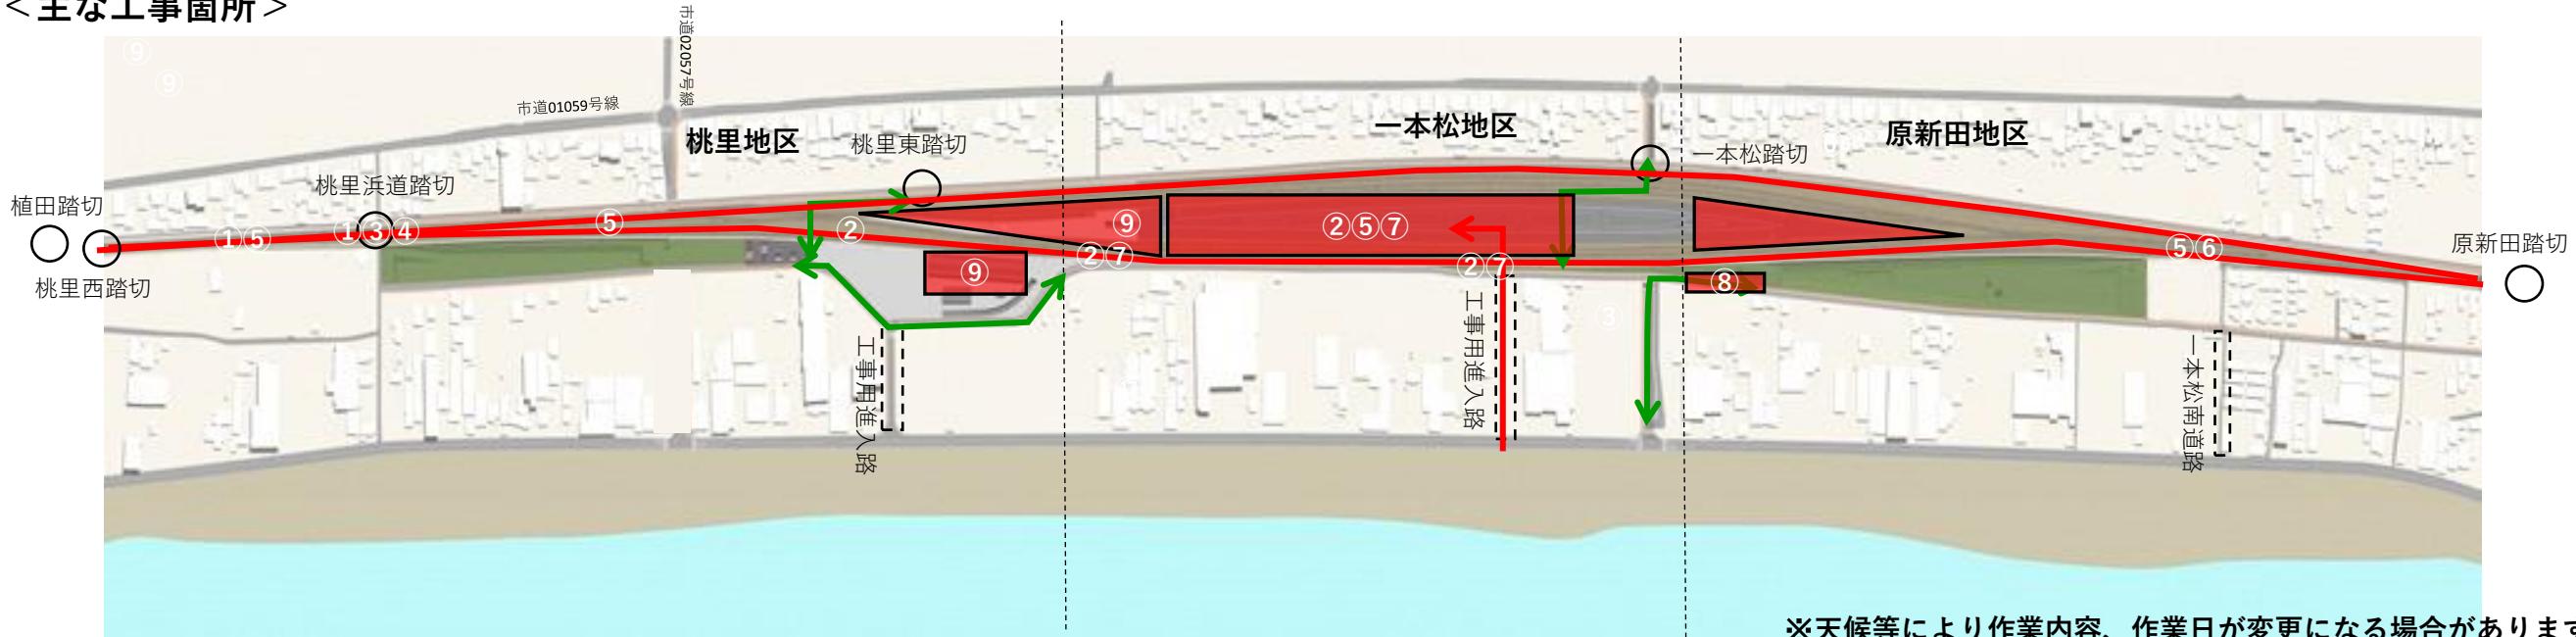

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

施工業者	施工場所	主な工事の内容	12月				1月								備 考		
			29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
3	名工建設(株)	① 排水工撤去工・路盤工	休工								●	●	●	●	●	休工	
4	名工建設(株)	② 軌道新設工	休工 (③踏切警備は継続)								●	●	●	●	●	休工	大型車による製品等納入 (桃里浜道踏切～中道・フロント部～テクノサイエンス間) 桃里浜道踏切全面通行止め : 1/6 (火) ~
		③ 踏切警備									●	●	-	-	-		10tダンプトラック : 3~5台/日 (名工建設現場事務所～作業ヤード) ※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有 令和8年5月中旬まで (24時間)
		④ 踏切撤去工									-	●	●	●	●		大型車による製品等納入 (桃里浜道踏切～中道・フロント部間) 桃里浜道踏切全面通行止め : 1/6 (火) ~ ※舗装破碎時に騒音振動有
12	新生テクノス(株)	⑤ 電気工事 (電柱撤去工、電車線設置工)	休工								●	●	●	●	-	●	夜間工事 : 1/8 (木)、1/11 (日)
13	新生テクノス(株)	⑥ 電気工事 (避雷針設置工)	休工								-	●	●	●	●	休工	
23	名工建設(株)	⑦ 軌道新設工	休工								-	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック : 3~5台/日 (フロント部～作業ヤード) ※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有
31	落合建設(株)	⑧ 土工・排水工	休工								●	●	●	●	●	休工	中道車両通行止め : 1/6 (火) ~ 3月上旬
33	名工建設(株)	⑨ 地盤改良杭工・外構工	休工								●	●	●	●	●	休工	
