

(国) 301号西浜名橋（通称：3番鉄橋）の耐震補強工事に伴い、令和2年11月中旬～下旬の間に「航路通行止め」の規制を行います。航路規制期間中は、皆様にご不便をおかけしますがご理解、ご協力をお願いします。（規制期間等の詳細は、別添の「工事のお知らせ」をご覧ください。）

規制期間・規制内容

東側航路 令和2年11月17日（火）～令和2年11月21日（土）

西側航路 令和2年11月24日（火）～令和2年11月28日（土）

※全面通行止め

～ 工事のお知らせ 国道301号西浜名橋耐震補強工事 ～

1. 工事概要

- 1) 工事名 令和元年度[第31-D7281-01号](国)301号 防災・安全交付金 (橋梁耐震対策) 工事 (西浜名橋耐震補強工)
- 2) 施工場所 静岡県湖西市新居町新居地内
- 3) 工期 令和元年9月18日 ~ 令和3年7月30日
- 4) 発注者 静岡県 浜松土木事務所
- 5) 請負者 五洋建設株式会社 静岡営業所

2. 工事事務所及び現場組織


工事事務所 五洋建設 西浜名橋耐震補強工事事務所
 住所 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島3481-37 ビスタ弁天202号室
 電話 053-489-6030
 ファックス 053-489-6031
 現場代理人 宮崎 恵介 080-2023-2786 (携帯)
 監理技術者 前田 寛 090-5003-6454 (携帯)

3. 工程表

工 種	数量	単位	令和2年(2020年)												令和3年(2021年)						
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
準備工	1	式	[スケジュール]												[スケジュール]						
フーチング清掃 機装台船組立			[スケジュール]												[スケジュール]						
仮締切工			[スケジュール]												[スケジュール]						
函体撤去・設置	1	式	[スケジュール]												[スケジュール]						
函体残置	1	式	[スケジュール]												[スケジュール]						
橋脚補強工			[スケジュール]												[スケジュール]						
P3,P6,P9,P12	1	式	[スケジュール]												[スケジュール]						
安全監視船	1	式	[スケジュール]												[スケジュール]						

工 種	数量	単位	令和2年																			
			11月																			
			5	10	15	20	25	30														
仮締切工																						
P9	1	式																				
P6	1	式																				
P3	1	式																				
P12	1	式																				

4. 作業状況図 (鋼製函体撤去時)

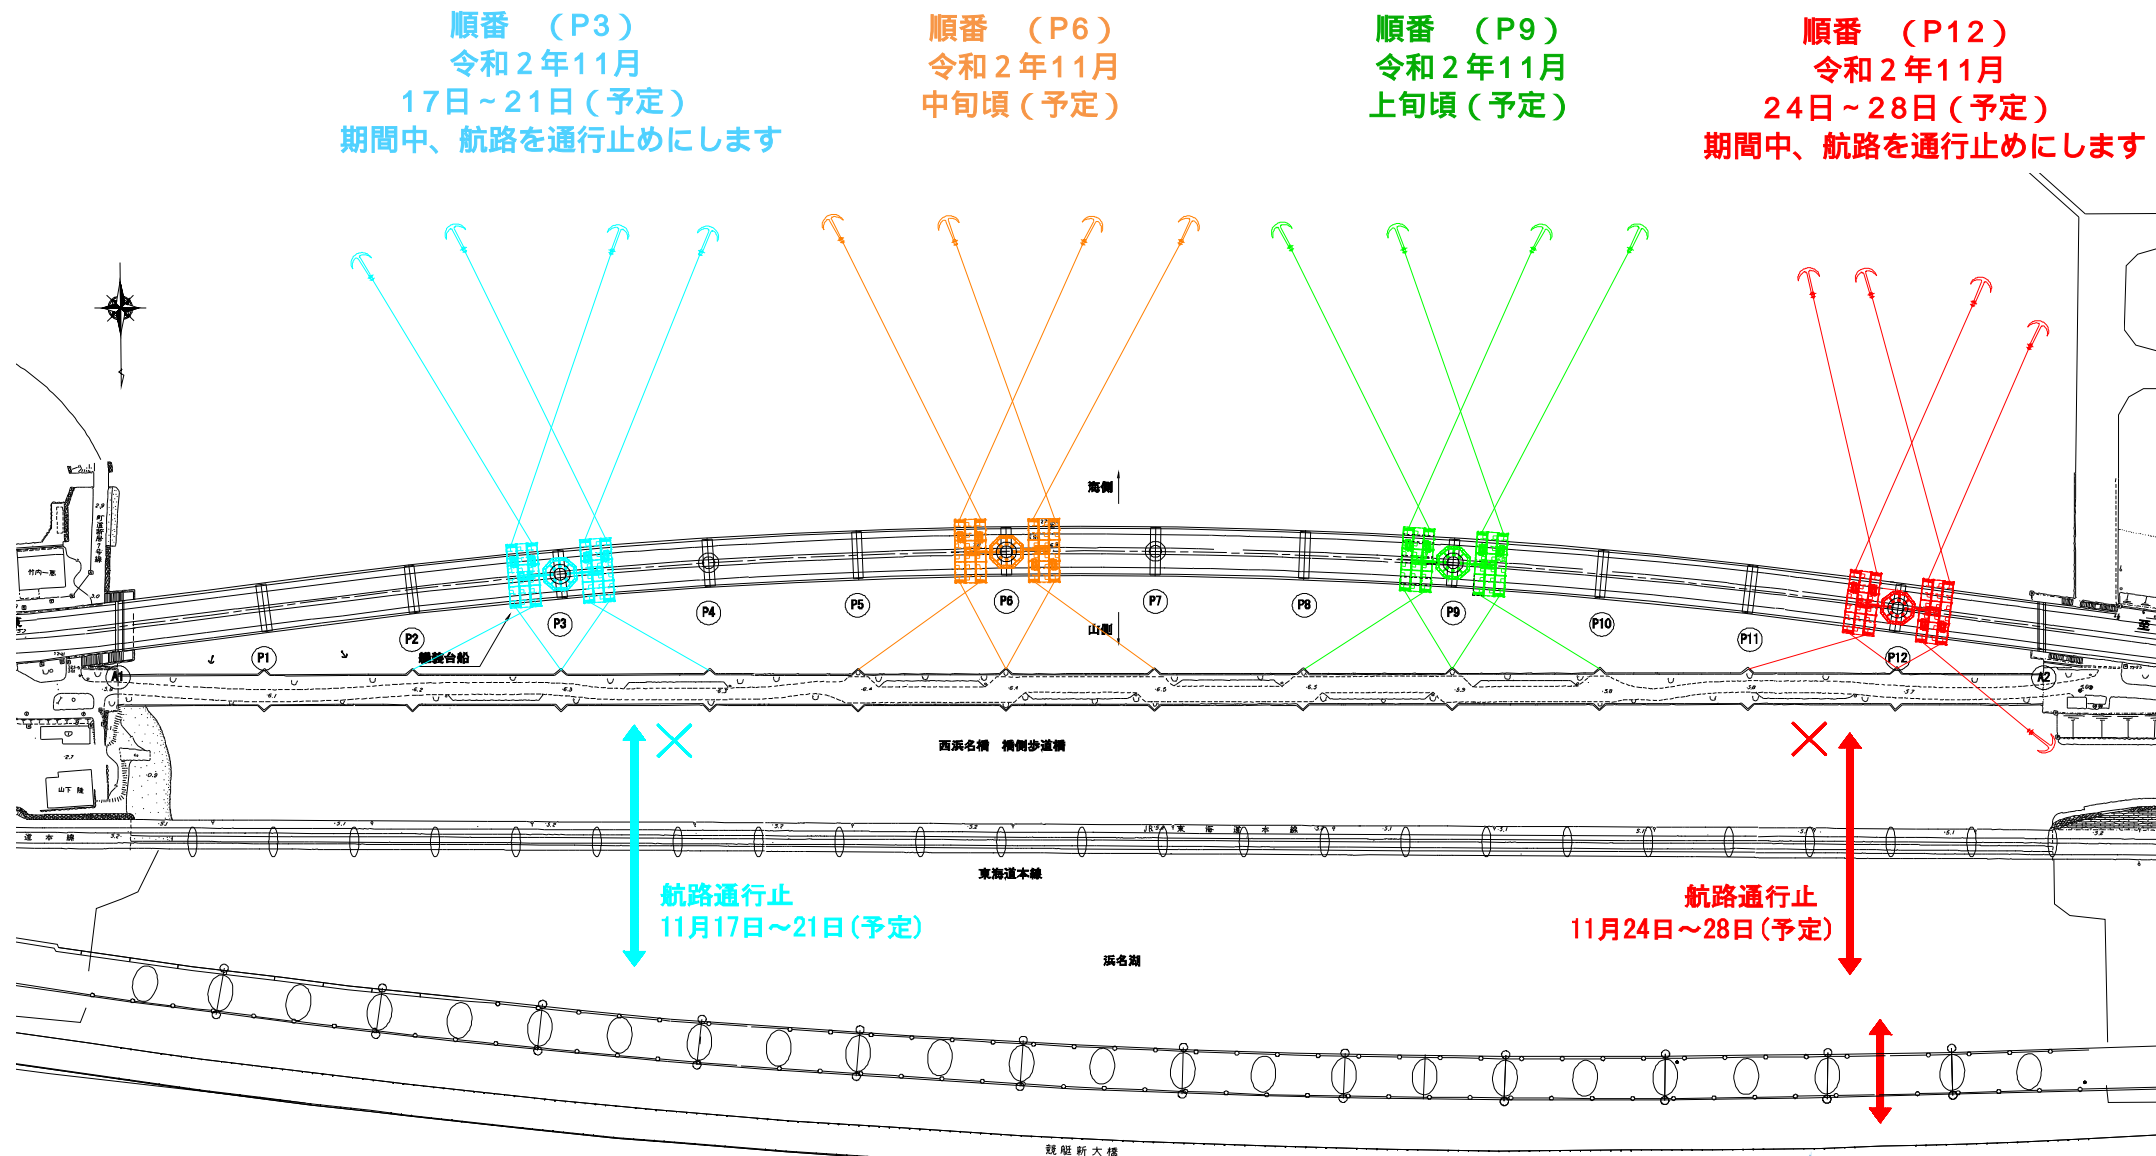

【鋼製函体撤去作業について】

- ・作業は1橋脚ずつ行います。
- ・作業日の日中には対象エリアの上下流に安全監視船を各1隻ずつ、計2隻配置します。
- ・作業期間中は、夜間も現場海域に作業台船を係留したままになります。
- ・作業船アンカー上部及び作業台船には簡易標識灯を設置します。

・P3施工期間中(11月17日~21日予定)の東側航路において船舶の航行ができなくなります。【気象・海象等により期間が延びる場合があります】

・P12施工期間中(11月24日~28日予定)の西側航路において船舶の航行ができなくなります。【気象・海象等により期間が延びる場合があります】

作業期間中はご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

●位置図

