


事故事例その4

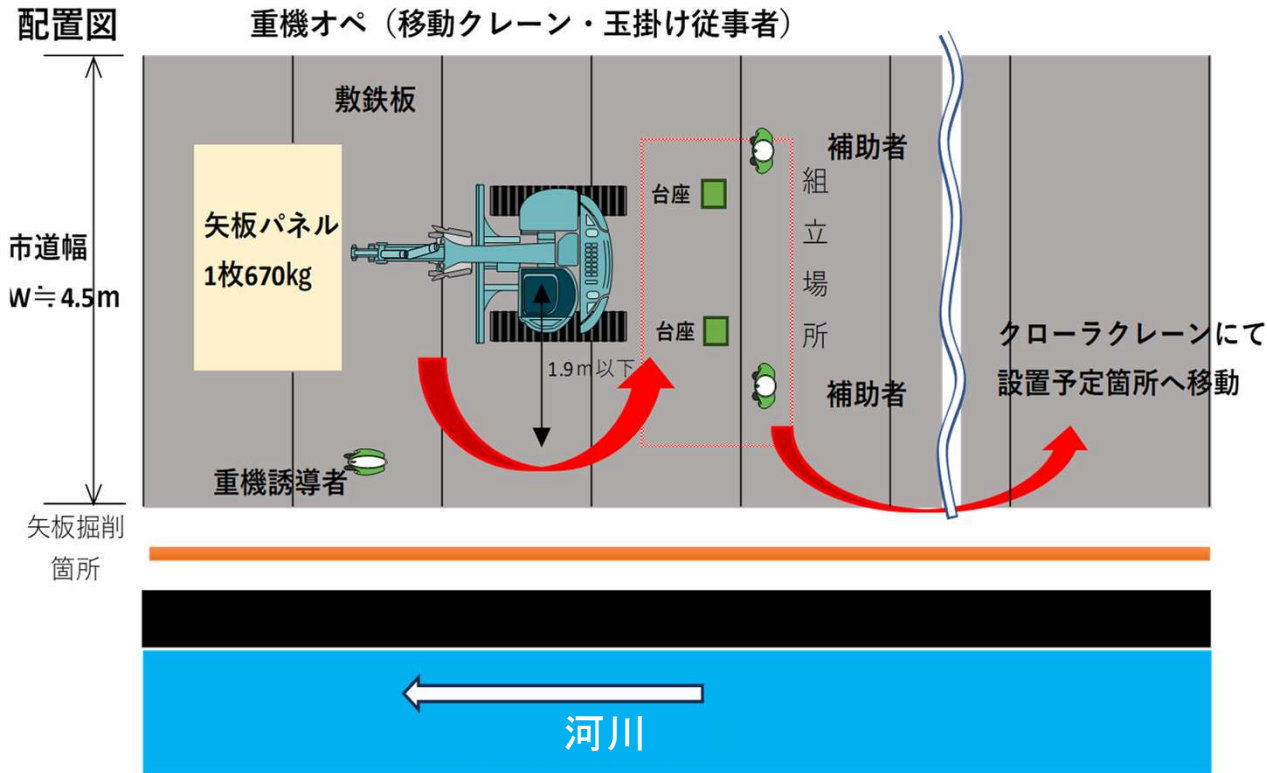

【事故概要】

バックホウにて矢板パネルを吊り上げて旋回した際、風の影響等でパネルが揺れたため、体勢を立て直そうと敷鉄板上へ着地させようとしたが重機の操作を誤った。その結果、吊上可能範囲外の川側掘削箇所（2.3m）へパネルを下ろしてしまい、バックホウが耐え切れず横転し、オペレーターが投げ出された。

【問題点】

安全な作業半径や風等の外的要因の余力を十分に考慮せずに重機を選定した。

【対策】

- ・より安全性の高いクローラークレーンでの重機作業に変更する。
- ・吊り上げの作業手順や留意点等、作業員全員での情報共有を図る。

