


【施設効果事例】初川砂防堰堤 しずおかけんあたましあたま (静岡県熱海市熱海)

位置図

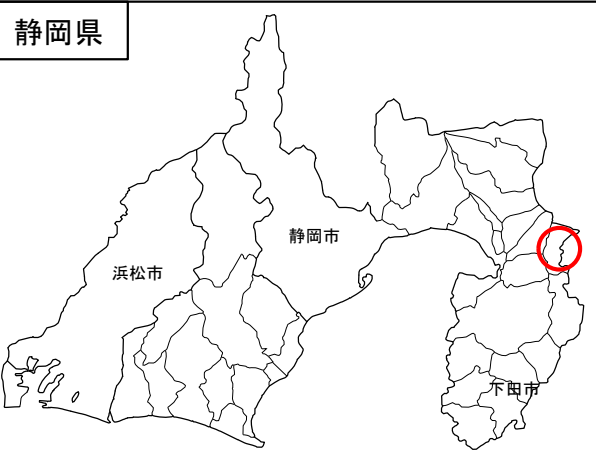

○令和6年8月22日から9月1日の台風第10号により、土石流が発生したが、県が整備した砂防堰堤により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和6年9月1日 (0時00分頃)
 降雨状況 : 連続雨量 368mm (8月29日16時 ~ 30日18時)
 時間最大雨量 46mm (8月30日16時 ~ 17時)
はつかわ 発生箇所 : 「初川4号砂防堰堤」静岡県熱海市 あたまし 熱海 あたま
 捕捉量 : 約170m³

初川4号砂防堰堤除石工 実施時

令和6年5月除石工事完了時



土砂捕捉状況

土石流補足 (令和6年9月2日撮影)

