【施設効果事例】東沢右支川砂防堰堤（静岡県富士市鵜無ヶ淵）

しずおかけんふじしうないがぶち

国土交通省

位置図

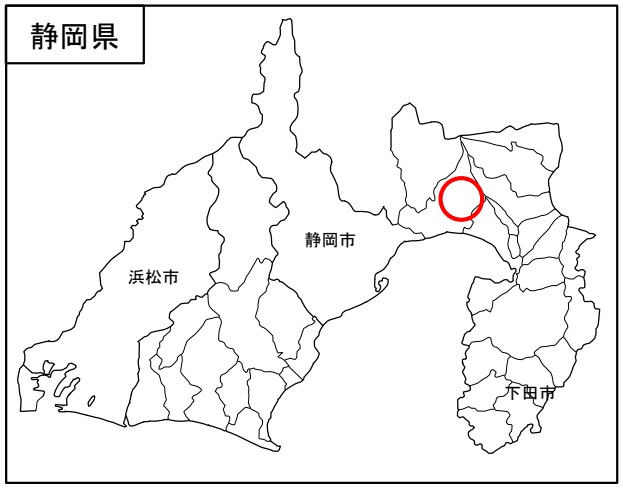

〇令和６年８月22日から９月1日の台風第10号により、土石流が発生したが、県が整備した砂防堰堤により土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日　：令和６年９月１日（0時00分頃）
降雨状況：連続雨量　　170mm　（８月29日16時　～30日８時）
　　時間最大雨量　　65mm　（８月31日16時　～　17時）
発生箇所：「東沢右支川砂防堰堤」静岡県　富士市　鵜無ヶ淵
捕捉量　：約600m^3

ひがしさわみぎしせん　ふじし　うないがぶち

東沢右支川除石工　実施時

令和６年4月除石工事完成時

土砂捕捉状況

土石流補足（令和６年9月24日撮影）
