


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

7月27日（月）～ 8月9日（日）

【7/26更新】

<主な工事箇所>

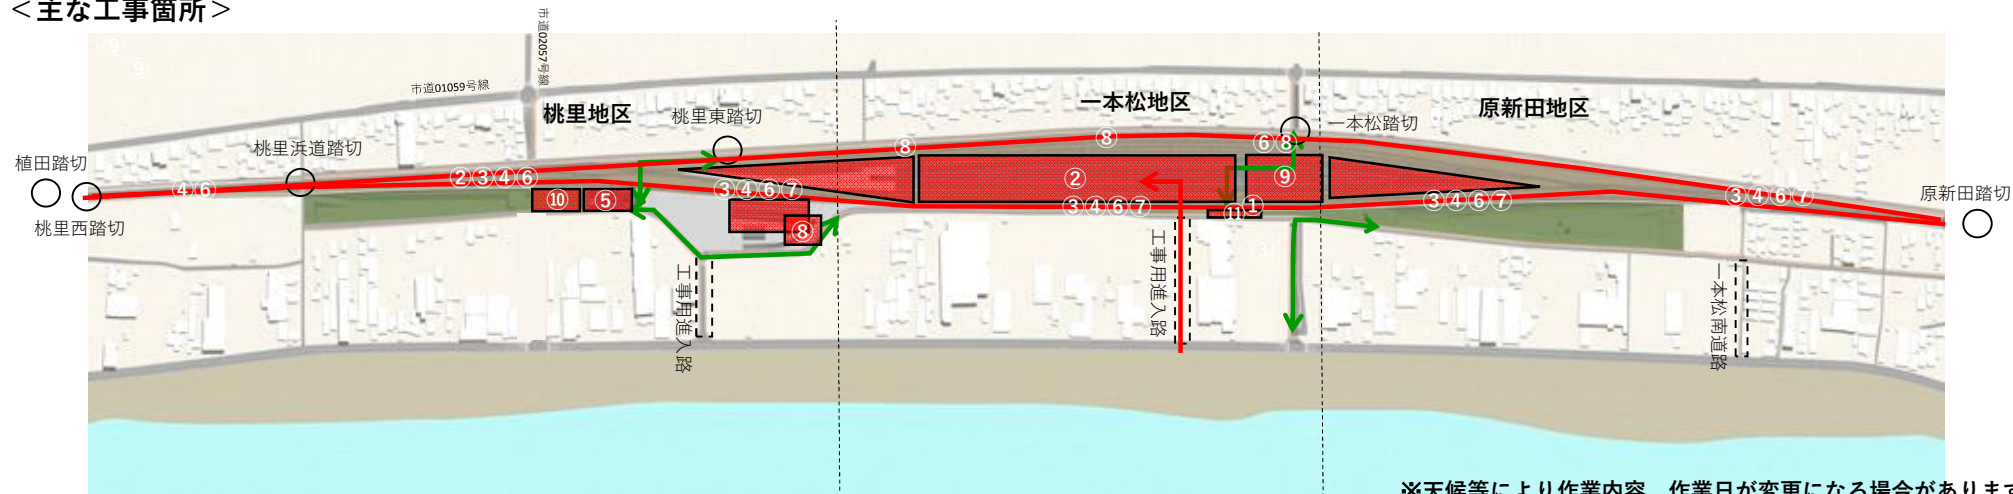

施工業者	施工場所	主な工事の内容	7月					8月									備 考
			27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
3	名工建設(株)	① 電気管路設置工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		大型車による製品等納入（施工ヤード～中道・フロント部）
4	名工建設(株)	② 軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		10tダンプトラック：3～5台/日 （フロント部～作業ヤード）
		③ 軌道整備工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			※作業時の騒音振動有 ※作業時の騒音振動有
12	新生テクノス(株)	④ 電気工事（電車線設置撤去工等）	●	●	●	－	－	－	－	●	●	●	－	－	休工		夜間工事：8/1、8/2、8/3 軌陸両用車：作業日
13	新生テクノス(株)	⑤ 電気工事（管路設置工等）	－	－	－	●	－	休工	－	－	－	－	－	－	休工		
14	新生テクノス(株)	⑥ 電気工事（ケーブル設置工、試験等）	－	●	－	●	－	休工	－	－	－	－	－	－	休工		
23	名工建設(株)	⑦ 軌道新設工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		10tダンプトラック：3～5台/日 （フロント部～作業ヤード） ※作業時の騒音振動有
35	新生テクノス(株)	⑧ 電気工事（照明架台設置工等）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	－	－	休工		
37	名工建設（株）	⑨ 舗装工・配水管設置工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		車両通行止め：7/27、7/29、7/30
38	丸一工業（株）	⑩ 工場製作工（橋脚等）	－	－	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		工場にて橋脚等製作中
39	（株）一杉興業	⑪ 準備工・ガードパイプ設置工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		車両通行止め：8/3～
