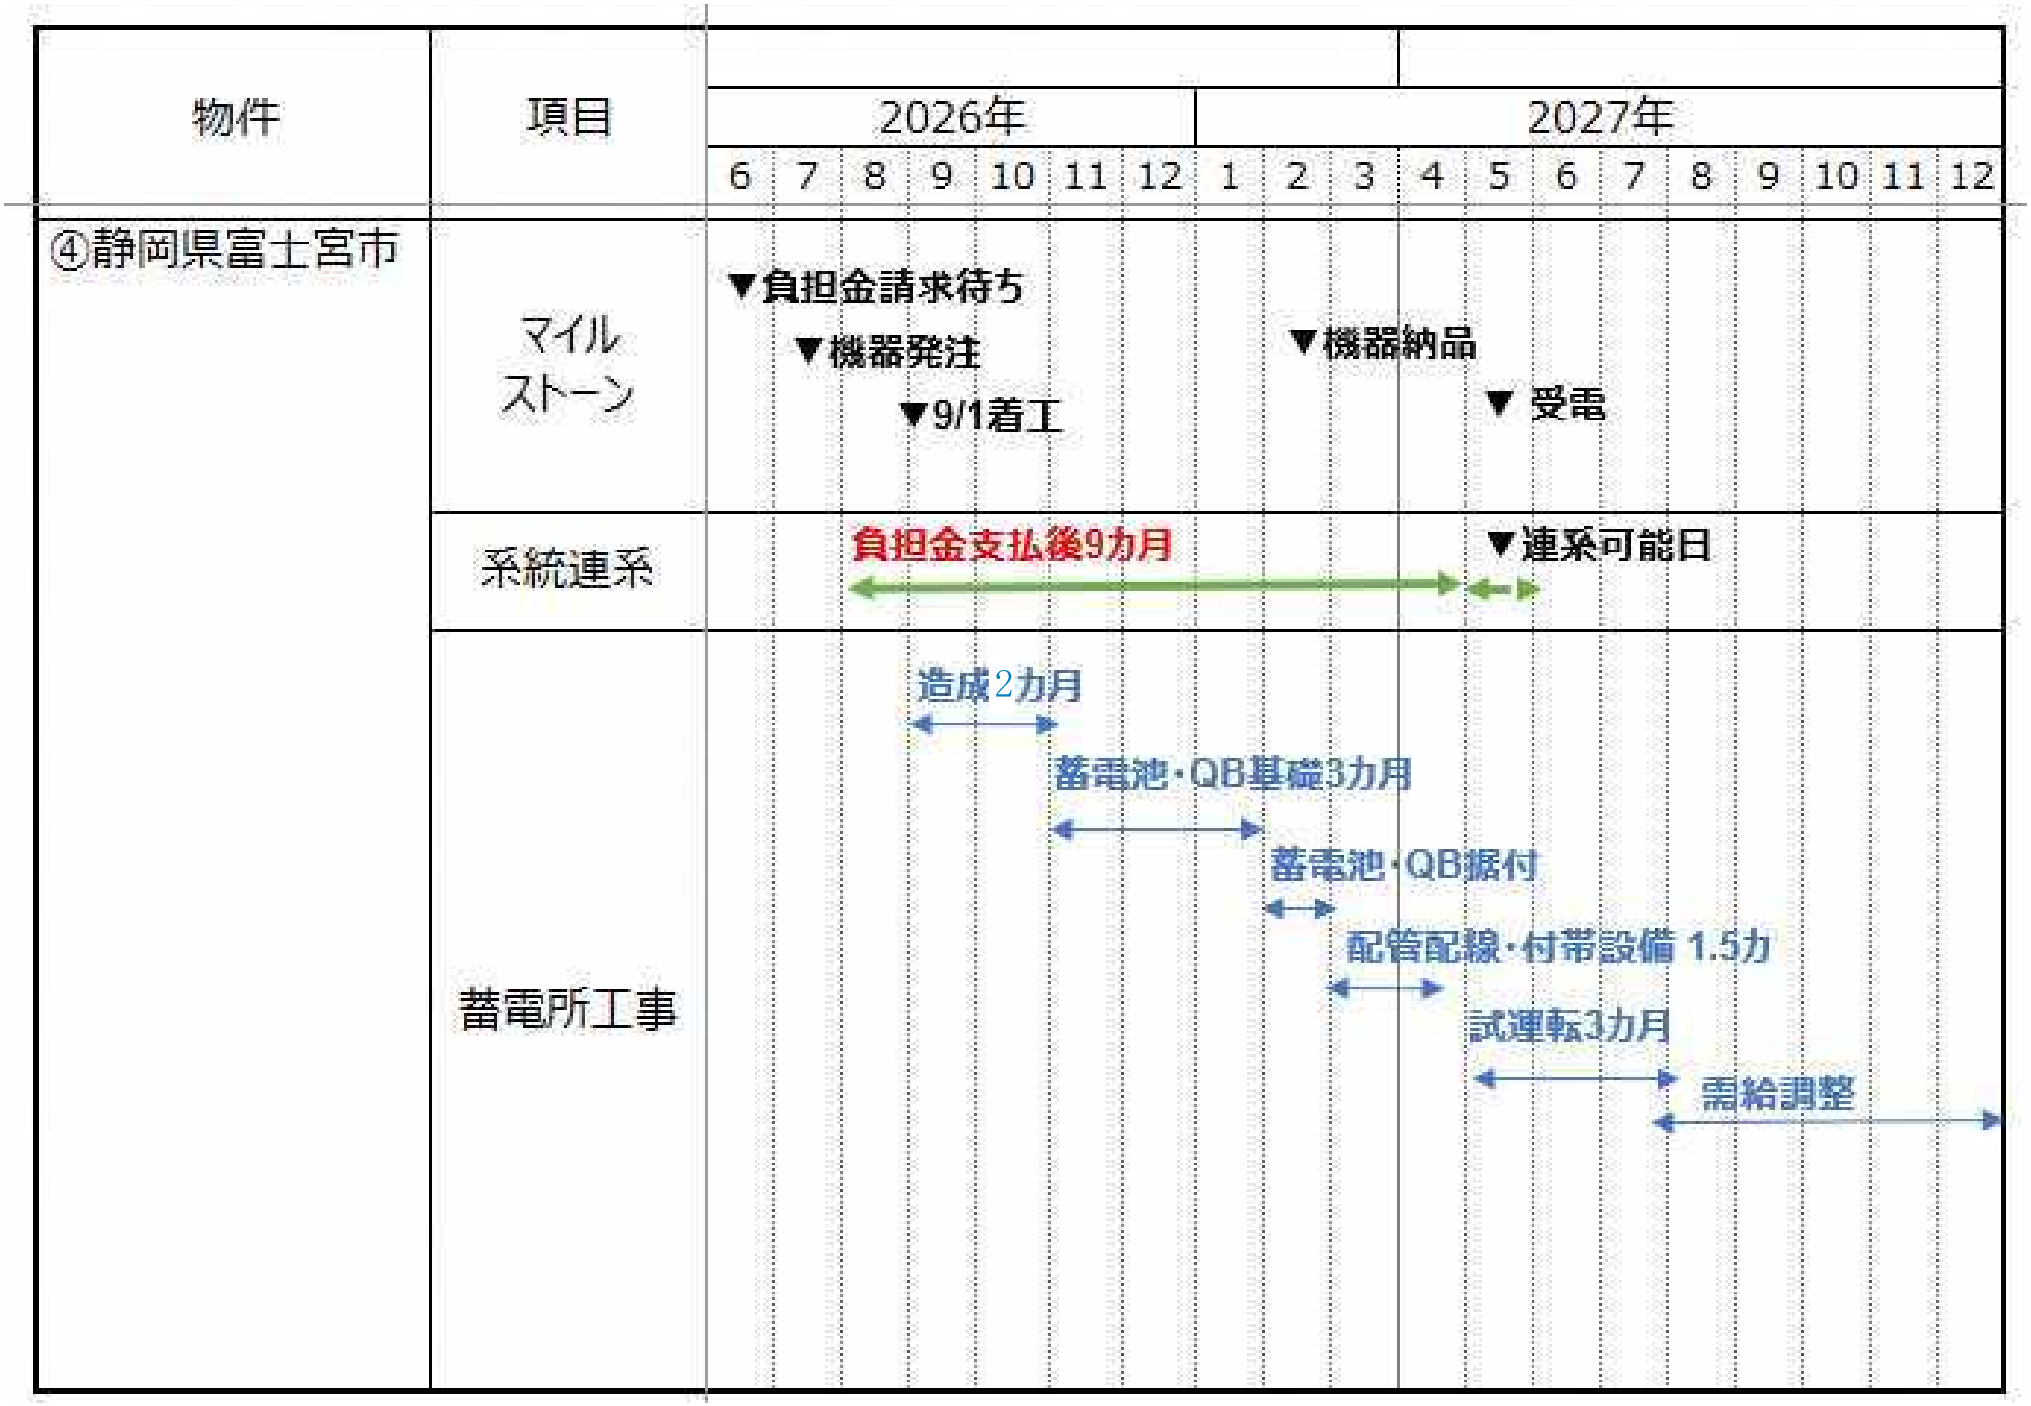
物件
項目
2026年
2027年
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
④静岡県富士宮市
マイル
ストーン
▼負担金請求待ち
▼機器発注
▼9/1着工
▼機器納品
▼ 受電
系統連系
負担金支払後9カ月
▼連系可能日
蓄電所工事
造成2カ月
蓄電池・QB基礎3カ月
蓄電池・QB据付
配管配線・付帯設備 1.5カ
試運転3カ月
需給調整
